



***Raport z monitoringu dokumentu
pn. „Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Dębica na lata 2016–2024”***

Listopad 2022



INICJATYWAŁOKALNA.PL
SP. Z O.O.

InicjatywaLokalna.pl
ul. Sienkiewicza 78, piętro IV, 25-501 Kielce
tel./fax 41 3430124 lub 507 048 678
www.inicjatywalokalna.eu

Spis treści

Wstęp.....	4
1. Metodologia monitorowania założeń programu	5
2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego	12
2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania.....	12
2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających	21
3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego	26
3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	26
Podsumowanie	35
Spis tabel	37
Spis wykresów.....	37

Wstęp

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024* ma system jego monitoringu skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 *Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji* (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz na zasadach określonych w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. *System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu*.

Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach monitorowania ma na celu wzmocnienie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie szerszego kontekstu oddziaływania programu.

Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2020–2021. Opracowany został na zlecenie Urzędu Gminy w Dębicy, przy współudziale zarówno Wydziału Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu, jak również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów i trudności, jakie mogą wystąpić podczas wdrażania następnych działań na obszarze rewitalizacji w kolejnych latach.

1. Metodologia monitorowania założeń programu

Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. *Sposoby monitorowania i sprawozdawczości*: „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (...) Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”¹.

Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią ocenę postępu i efektywności głównych założeń GPR, natomiast wskaźniki oddziaływania posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1.

Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy.

Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Wydział Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu. Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 programu, jego zadania to przede wszystkim: „systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne samodzielne stanowiska pracy/referaty (aktualnie wydziały) UG Dębica, jednostki

¹ *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024* (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/443/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 7 grudnia 2017 r.), s. 148.

organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”².

Wydział Inwestycji UG w Dębicy jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie ma również następujące zadania³:

- 1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów zestawu wskaźników;
- 2) sporządzanie co 2 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Dębica. Raport będzie zawierał informacje na temat wartości mierzonych corocznie wskaźników monitoringowych (produktu, rezultatu) i wartości wskaźników oddziaływania, mierzonych co 2 lata.
- 3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (ugdebica.pl, w zakładce „Rewitalizacja Gminy Dębica”), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl), a także przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji.

Rada Gminy Dębica analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu we wdrożeniu zapisów.

Kierując się zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, w IV kwartale 2022 roku przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2020–2021, będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:

- Cel rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców;*
- Cel rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców.*

² Gminny Program Rewitalizacji..., s. 148–149.

³ jw., s. 148–149.

W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd Gminy Dębica oraz instytucje zewnętrzne – Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. W tabeli 2 przeanalizowano 11 wskaźników obrazujących stan obszaru rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 2014, do końca drugiego okresu sprawozdawczego, czyli 2021 roku.

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu

Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Średnia wartość dla gminy (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa (stan na 31.12.2024 r.)
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA						
Cel rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców	Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem	%	Urząd Gminy Dębica	16,1	21,8	20,0
	Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	0,44	0,41	0,5
	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	-1,4	0,3	0,1
	Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	%	Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy	9,8	9,2	8,0
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica	8,2	7,2	7,0
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica	1,9	1,8	1,5
	Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)	%	Urząd Gminy Dębica	39,2	47,7	49,0
	Liczb zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	2,2	2,9	3,0

	Liczb nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	0,35	0,36	0,40
Cel rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców	Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	ha	Urząd Gminy Dębica	0,6	0,3	0,8
	Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	szt.	Urząd Gminy Dębica	4,4	35,5	7,0
Projekty/Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	WSKAŹNIKI PRODUKTU					
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0		8,7
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	szt.	Beneficjenci projektów	0		70
	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań	szt.	Beneficjenci projektów	0		12
	Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków	szt.	Beneficjenci projektów	0		3
	Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	szt.	Beneficjenci projektów	0		3
	Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	Beneficjenci projektów	0		1,3
	Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych	km	Beneficjenci projektów	0		1,3
	Liczba osób objętych wsparciem	osoby	Beneficjenci projektów	0		500
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0		40
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0		60

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	6
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	40
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	90
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Ilość utworzonych grup wsparcia	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej	osoby	Beneficjenci projektów	0	1 500
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	Beneficjenci projektów	0	0,4
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	Beneficjenci projektów	0	400
Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Średni czas przejazdu między dwoma punktami (początkiem i końcem odcinka drogi)	minuty	Beneficjenci projektów	0	Wartość zostanie określona na podstawie dokumentacji przed realizacją projektu
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań)	osoby	Beneficjenci projektów	0	400
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	15

	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	30
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	5
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	40
	Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez)	osoby	Beneficjenci projektów	0	500
	Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych	szt.	Beneficjenci projektów	0	1

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, s. 151–154

2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy (tabela 2). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane bazowe dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku.

Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12)


Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	WARTOŚCI BAZOWE		WARTOŚĆ DOCELOWA dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2024 r.)	WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA			
				2014			2020		2021	
				Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy		Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy	Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy
Cel 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców	Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem	%	Urząd Gminy Dębica	16,1	21,8	20,0	15,2	20,6	15,8	20,7
	Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	0,44	0,41	0,5	-0,84	-0,07	-3,51	-0,15
	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	-1,4	0,3	0,1	-2,2	-0,4	-3,0	-0,4
	Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	%	Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy	9,8	9,2	8,0	5,2	4,4	4,0	3,3
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica	8,2	7,2	7,0	3,6	4,1	3,3	3,3
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica	1,9	1,8	1,5	1,2	1,3	1,2	1,0
	Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)	%	Urząd Gminy Dębica	39,2	47,7	49,0	–	–	–	–
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	2,2	2,9	3,0	5,3	7,3	5,6	7,8
	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	0,35	0,36	0,40	0,28	0,58	0,34	0,80
Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców	Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	ha	Urząd Gminy Dębica	0,6	0,3	0,8	0,2	0,2	0,3	0,2
	Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	szt.	Urząd Gminy Dębica	4,4	35,5	7,0	0,0	25,7	0,0	24,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabeli 2, dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych.

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* jest wskaźnik *udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem*, który obrazuje sytuację demograficzną na danym obszarze. Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności wpływają zarówno na liczbę ludności, jak i na jej strukturę wiekową. Analizując udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu do średniej dla całej gminy, struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji na przestrzeni badanego okresu sprawozdawczego przedstawia się mniej korzystnie, jednakże w 2021 roku, w porównaniu do roku 2020 – wskaźnik wykazał tendencję wzrostową (wykres 1).


Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem

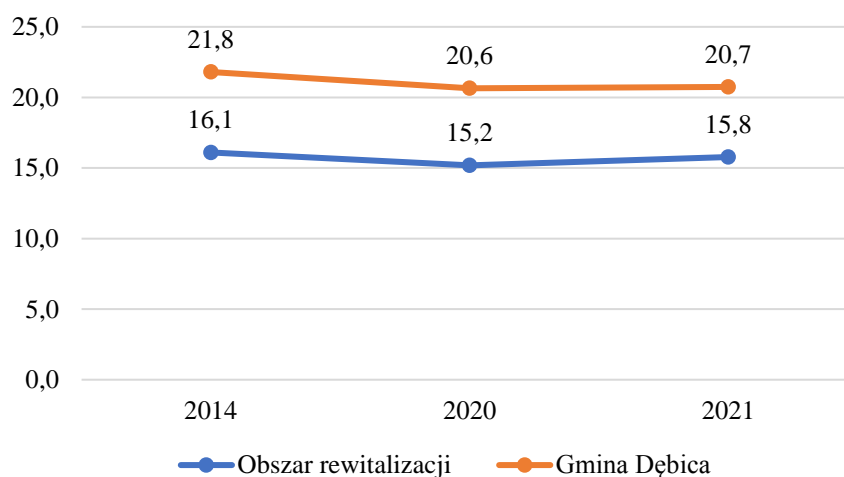

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Biorąc pod uwagę dane dotyczące *przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania* można stwierdzić, że wskaźnik ten wypadł mniej korzystnie niż średnia wartość dla gminy i osiągnął w 2021 r. niską wartość: -3,51 – jest to niekorzystna sytuacja świadcząca o ubytku naturalnym na obszarze rewitalizacji (wykres 2).


Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

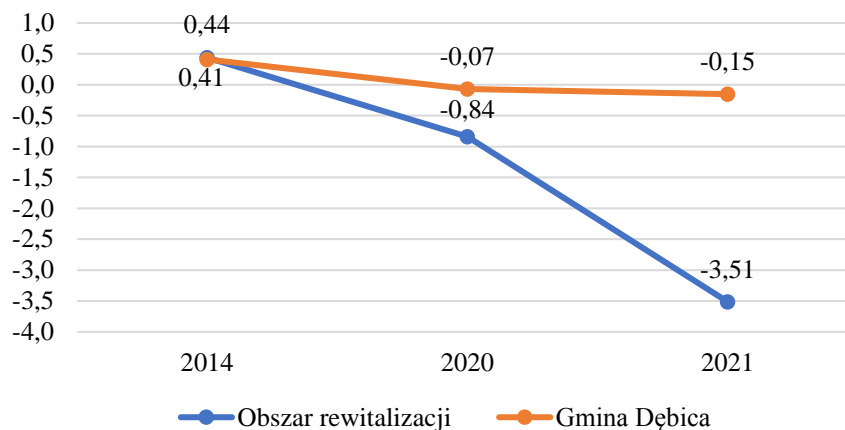

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Kolejnym wskaźnikiem jest *saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*, czyli różnica między napływem a odpływem z danego obszaru w określonym czasie. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym pogłębił się i był niższy niż średnia dla Gminy Dębica (wykres 3). Bezrobocie jest jednym z powodów migracji ludzi młodych z terenu gminy.

Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

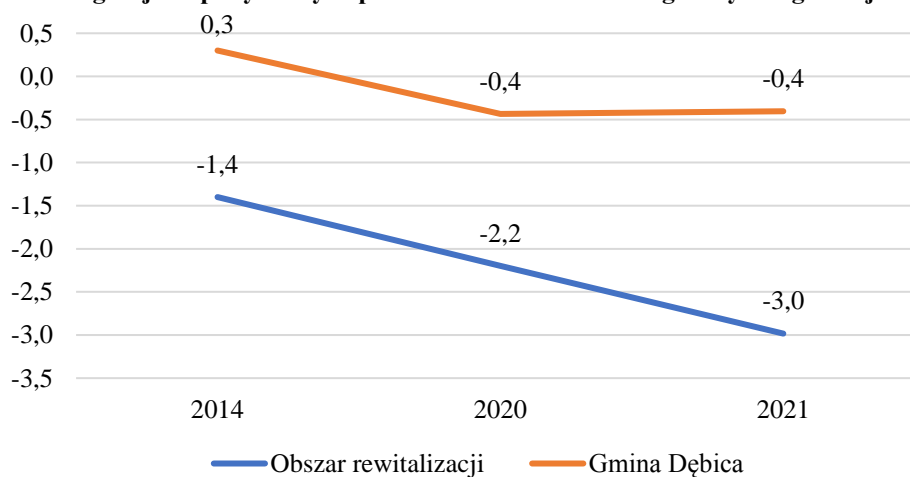


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* jest możliwe dzięki wskaźnikowi *udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania*. Z analizy danych obejmujących lata 2020–2021 wynika, że odsetek osób bezrobotnych na obszarze rewitalizacji systematycznie spadał. Należy również podkreślić, że

wskaźnik ten dla obszaru rewitalizacji, w porównaniu do średniej dla całej gminy, wypadł mniej korzystnie (wykres 4). Trzeba kontynuować i zintensyfikować działania przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych oraz dostosowania kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy.


Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania

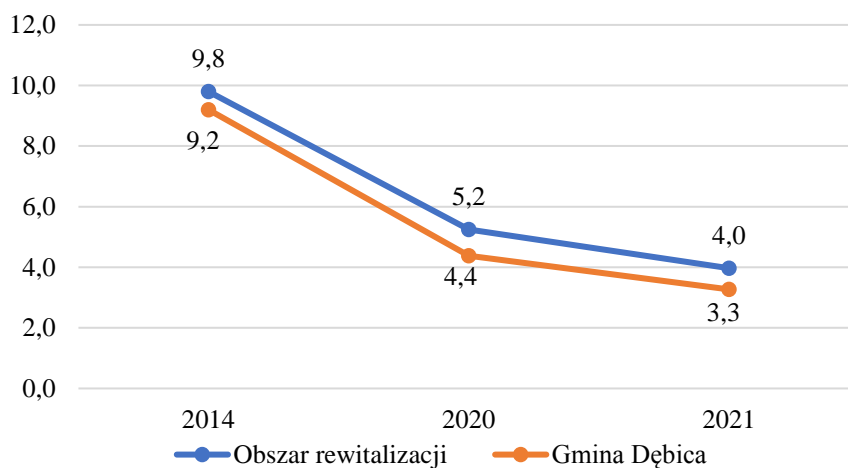

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można zauważyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym przybrał tendencję spadkową, co jest pozytywnym zjawiskiem – w 2021 r. wyniósł tyle samo dla obszaru rewitalizacji jak i Gminy Dębica: 3,3 (wykres 5). Należy pamiętać, że rozproszenie koncentracji problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na terenie gminy.


Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

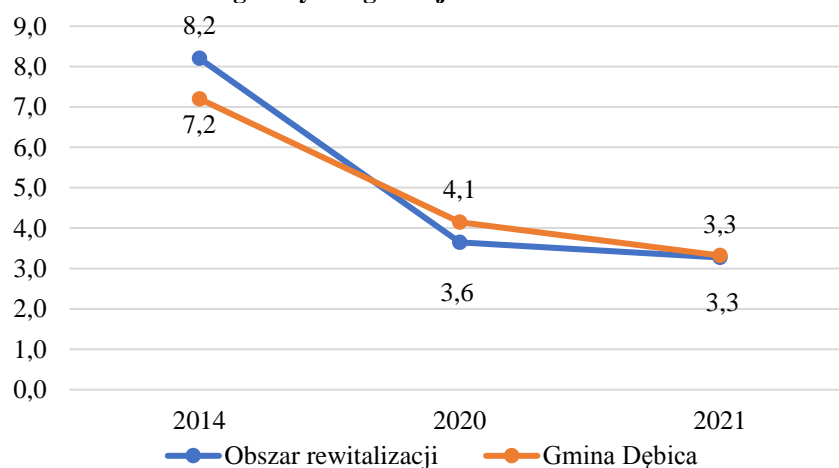

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w okresie sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji utrzymywał się na tym samym poziomie (1,2) i w 2021 r. był wyższy, a więc niekorzystny, w porównaniu do gminy (wykres 6). Należy prowadzić dalsze działania w sferze społecznej mające na celu zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia.


Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

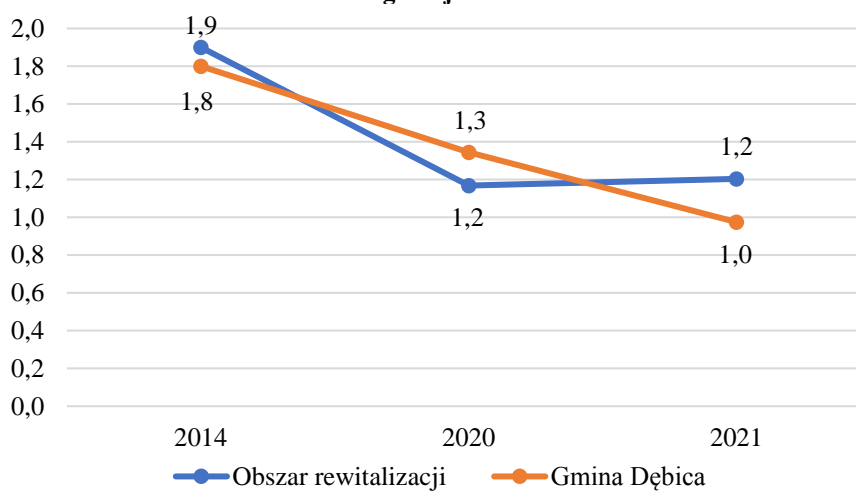

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* w zakresie przedsiębiorczości odbywa się poprzez wskaźnik *liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*. Na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten był niższy w porównaniu ze średnią dla Gminy Dębica, co świadczy o niższej aktywności gospodarczej mieszkańców. Jednakże można także zauważyć niewielki wzrost wskaźnika pomiędzy 2020 a 2021 rokiem (wykres 7).


Wykres 7 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

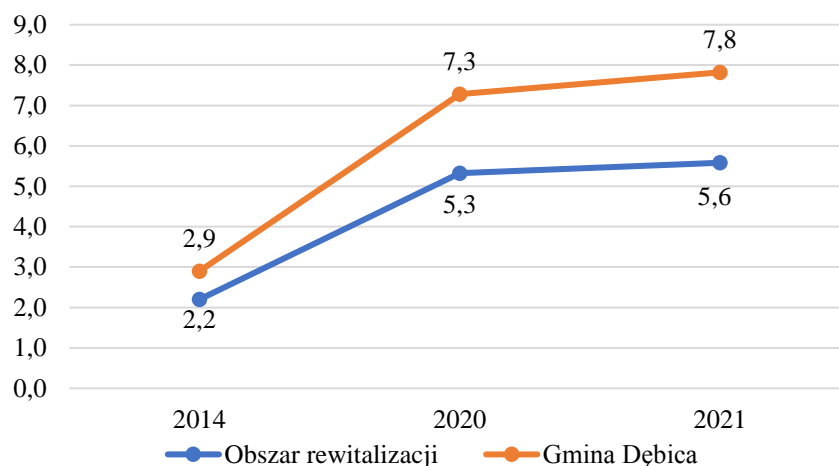

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji w 2021 roku w porównaniu do 2020 – ogólna liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych w rejestrze REGON miała tendencję wzrostową, jednakże wartość ta była dużo niższa w porównaniu do obszaru całej gminy (wykres 8). To także świadczy o niewystarczającej przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.


Wykres 8 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

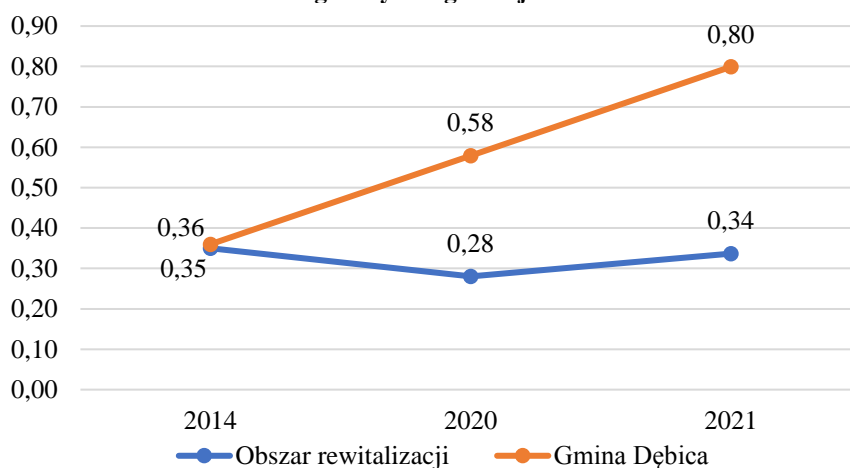

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców* jest wskaźnik *powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców*. Stan zagospodarowania przestrzeni publicznych dla obszaru rewitalizacji utrzymywał się na tym samym poziomie w 2020 r. co średnia wartość dla gminy, jednakże w 2021 r. wartość dla obszaru rewitalizacji była wyższa (wykres 9). Należy dalej prowadzić działania rewitalizacyjne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gdyż im szerzej będzie rozbudowana oferta rekreacyjna i kulturalna na poziomie lokalnym, tym bardziej będą mieszkańcy zadowoleni z miejsca zamieszkania i skłonni do działania obywatelskiego i aktywności społecznej na jego obszarze.


Wykres 9 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców

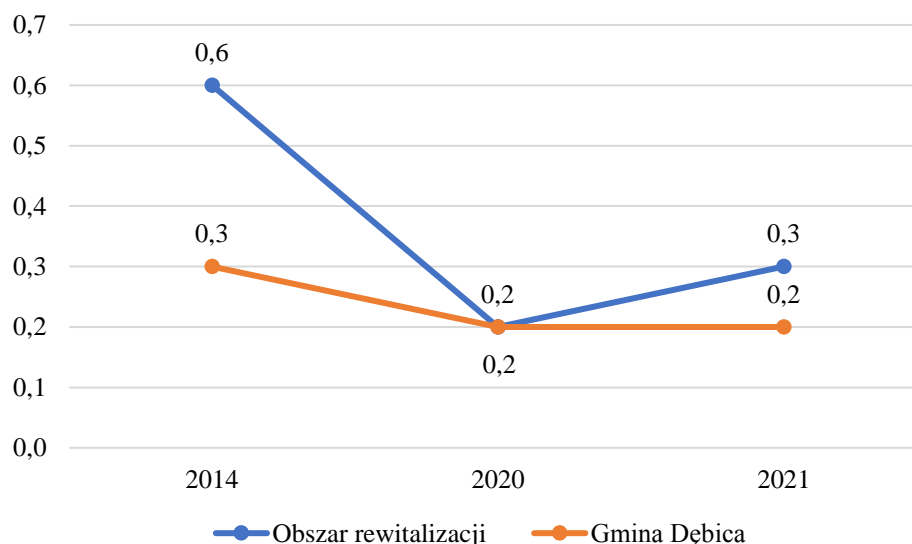

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców* odbywa się również poprzez dane dotyczące *budynków mieszkalnych nowo oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców*. W okresie sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji nie oddano do użytkowania żadnego budynku mieszkalnego (wykres 10). Wynika to m.in. z faktu ograniczenia przestrzennego miejscowości – dookoła są lasy będące w przeważającej większości w zarządzie Lasów Państwowych.

Wykres 10 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

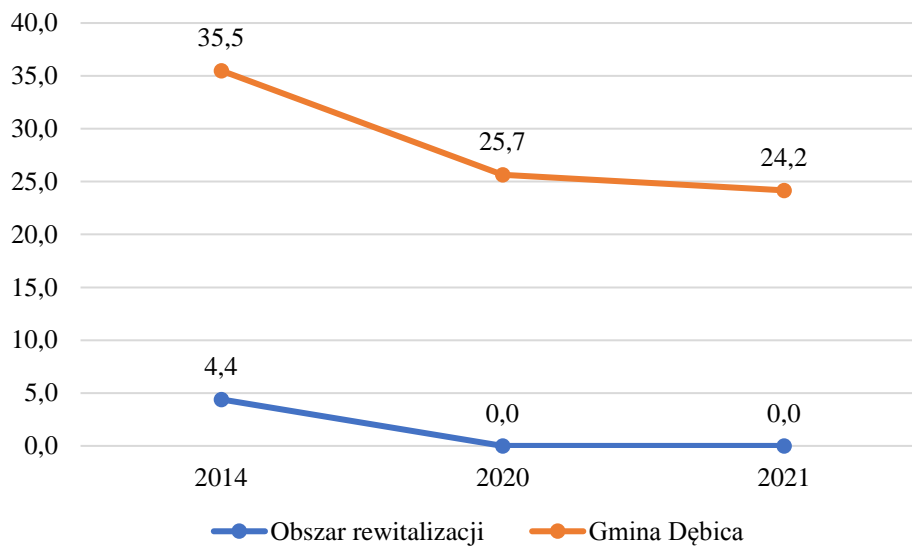

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica

2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji. Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2021 roku w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 3, natomiast łączne wartości danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych

Lp.	Nazwa projektu	Wskaźniki	Wartość wskaźnika wg stanu na 31.12.2021 r.
1.	<i>Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,07
		Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków [szt.]	1
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	1
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	0
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	0
2.	<i>Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.]	0
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [os.]	0
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	0
		Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych [szt.]	0
3.	<i>Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.]	0

4.	<i>Rodzina siłą przyszłości</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [os.]	0
5.	<i>Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej [szt.]	0
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os./rok]	0
		Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych [szt.]	0
6.	<i>Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębica</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań) [os.]	0
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.]	0
7.	<i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	1,14
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.]	0
8.	<i>UNIwersytet Młodego Człowieka – edukacja, integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</i>	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań [szt.]	0
		Liczba osób objętych wsparciem [os.]	0
		Ilość utworzonych grup wsparcia [szt.]	0
9.	<i>Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży</i>	Liczba osób objętych wsparciem [os.]	0
		Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [szt.]	0
		Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez) [os.]	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Źródło informacji	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa (stan na dzień 31.12.2024 r.)	Wartość osiągnięta dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2021 r.)	Poziom osiągnięcia określonej wartości docelowej wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (%)
1.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0	8,7	1,21	13,90
2.	Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	1	33,33
3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	1	33,33
4.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	Beneficjenci projektów	0	0,4	0	0,00
5.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	Beneficjenci projektów	0	400	0	0,00
6.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	szt.	Beneficjenci projektów	0	70	0	0,00
7.	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	90	0	0,00
8.	Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych	szt.	Beneficjenci projektów	0	1	0	0,00
9.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	40	0	0,00
10.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	6	0	0,00
11.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	30	0	0,00
12.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	15	0	0,00

Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024”

13.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	60	0	0,00
14.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	40	0	0,00
15.	Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
16.	Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej	os./rok	Beneficjenci projektów	0	1 500	0	0,00
17.	Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
18.	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań)	os.	Beneficjenci projektów	0	400	0	0,00
19.	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań	szt.	Beneficjenci projektów	0	12	0	0,00
20.	Liczba osób objętych wsparciem	os.	Beneficjenci projektów	0	500	0	0,00
21.	Ilość utworzonych grup wsparcia	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
22.	Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez)	os.	Beneficjenci projektów	0	500	0	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.

W tabeli 5 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w GPR, natomiast w tabeli 6 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie.

Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR						WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2021 r.						
Lp.	Nazwa projektu	Podmioty realizujące	Lokalizacja	Okres realizacji	Szacowana wartość brutto (w mln zł)	Stan realizacji (tak/nie/częściowo)	Podmioty realizujące	Uwagi do zakresu rzeczowego	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Wydatki (w zł) poniesione w okresie sprawozdawczym (2020–2021)
1.	<i>Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich</i>	Gmina Dębica, partner społeczny/gospodarczy (wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą wdrożeniową), gminy partnerskie DROF (Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego)	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33,47)	2019–2020	5,0	Częściowo	Gmina Dębica	Remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane obejmujące remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu wraz z wymianą i modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej w częściach wspólnych budynku. Zadanie obejmuje także dostawę wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania budynku socjalnego.	2021	690 250,00	Dotacja UE: 350 243,94 Budżet gminy: 293 306,89 Budżet państwa: 46 699,17	690 250,00
2.	<i>Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33)	2020–2021	2,0	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 47)	2021–2022	0,8	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Rodzina siłą przyszłości</i>	Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33)	2021–2023	0,9	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu</i>	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 36A)	2019–2021	2,5	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębica</i>	Nadleśnictwo Dębica, Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (dz. ewid. 3665, obręb 16)	2018	0,1	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

7.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (dz. ewid. 3589, w obrębie Pustków-Osiedle)	2019	0,5	Częściowo	Gmina Dębica	Zadanie obejmuje urządzenia placu zabaw takie jak piaskownica kwadratowa, huśtawka podwójna wahadłowa, domek z podestem, dwa sprężynowce, budka Krasnoludka metalowa, zestaw zabawowy, karuzela z czterema siedziskami, drabinka pozioma, ruchomy pomost, huśtawka ważka bez oparcia z oponami, zestaw zabawowy Labirynt oraz wyposażenie placu zabaw takie jak: stojak na rowery 6 stanowiskowy, 6 koszy na śmieci, 12 ławek parkowych i regulamin placu zabaw.	2021	299 000,00	Dotacja UE: 118 671,05 Budżet gminy: 180 328,95	299 000,00
8.	UNIwersytet Młodego Człowieka – edukacja, integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gmina Dębica, Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasza Sprawa, partnerzy społeczni (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe)	Obszar rewitalizacji	2019–2022	1,0	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży	Gmina Dębica, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy nieformalne	Obszar rewitalizacji	2018–2023	1,5	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica


Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 9 zaplanowanych projektów podstawowych ujętych w GPR, zaczęto realizację dwóch projektów. Należy nadmienić, iż w GPR zamieszczono 10 projektów podstawowych, jednakże w latach 2019–2020 zrealizowano projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle”, którego nie brano pod uwagę tworząc niniejszy raport. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i społecznym, przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 5, nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane inwestycje w okresie sprawozdawczym (lata 2020–2021) wyniosły 989 250,00 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej i środki z budżetu gminy, a także z budżetu państwa. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

- budżet Gminy Dębica: 473 635,84 zł;
- dotacje z UE: 468 914,99 zł;
- budżet państwa: 46 699,17 zł.

Na wykresie 11 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym.

Wykres 11 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych

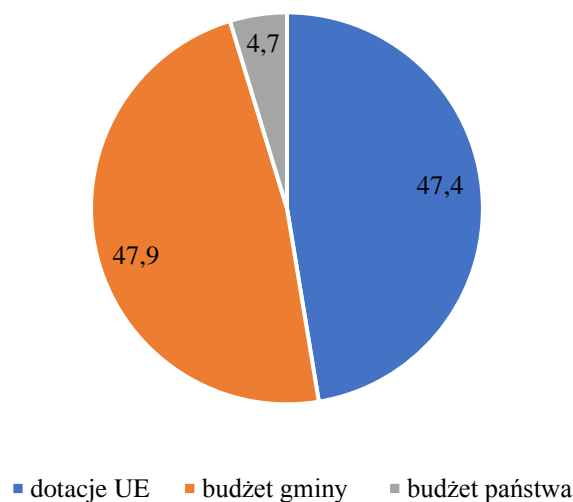

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji inwestycje jeszcze niezrealizowane lub nawet nierozpoczęte tj. projekty pt. *Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu* oraz *UNIWERSYTET MŁODEGO CZŁOWIEKA – edukacja, integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu* mają zostać zrealizowane do końca 2022 roku, natomiast projekty pt. *Rodzina siłą przyszłości* oraz *Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży* mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku.

Inwestycje z projektu podstawowego pt. *Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębica*, które zostały zaplanowane w GPR do realizacji w 2018 r., a także inwestycje z projektu pt. *Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu*, które zostały zaplanowane w GPR do realizacji do 2021 r., planowane są do realizacji w późniejszym terminie, w okresie obowiązywania dokumentu, tj. do 2026 r. z powodu braku środków. Natomiast inwestycje z projektu podstawowego pt. *Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle* nie będą wykonane, ponieważ budynek Internatu będący własnością Powiatu Dębickiego, w którym zgodnie z zapisami GPR miał być zlokalizowany żłobek (zakładający również przebudowę i rozbudowę budynku Internatu na potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla Seniora), został sprzedany firmie deweloperskiej.

Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR

WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego	Podmioty realizujące	Tytuł projektu	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Nazwa programu	Zakres rzeczowy
1.	Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
2.	Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
3.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy	„Aktywna Tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	Od 2019 r. do nadal	17 500,00	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Brak danych	W ramach projektu zakupiono 2 zestawy tablic interaktywnych wraz z projektorami i nagłośnieniem.
			„Laboratorium Przyszłości”	Od 2021 r. do nadal	81 300,00	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Brak danych	W ramach projektu zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
			„Koloratorium” – program społeczny Fundacji Śnieżka	2021–2022	30 000,00	Fundacja Śnieżka	Brak danych	W ramach projektu wykonano remont i wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w meble szkolne oraz pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną z projektorem, mikroskopy itd.
			Laptopy	2021	23 580,00	Środki własne gminy	Brak danych	W ramach projektu doposażono szkołę w 10 laptopów wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania oraz w pracowni informatycznej.
4.	Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

5.	<i>Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną</i>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
6.	<i>Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców</i>	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica	Nie dotyczy	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	W latach 2020–2021 na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustowie-Osiedlu organizowano program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla dzieci klas I–III, Gminną Ligę Amatorskiej Piłki Siatkowej oraz zajęcia piłki nożnej w Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica.
7.	<i>Zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni w obszarach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej</i>	Gmina Dębica	Budowa Miasteczka ruchu drogowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych do "Miasteczka ruchu drogowego" wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Pustków-Osiedle	19.11.2021–30.12.2022	475 699,25	Środki własne gminy	Brak danych	W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostały ścieżki pieszo-jezdne, obiekty małej architektury (lampa parkowo-solarna typu LED, tablica informacyjna wraz z regulaminem użytkowania miasteczka, stojak na rowery, parkowy kosz na śmieci, ławka parkowa), zamontowano oznakowania, symulator, znaki drogowe, a także zostało wykonane oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony w ramach <i>Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i> , Priorytet III <i>Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego</i> , Działanie 3.1. <i>Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T</i> . Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Na chwilę obecną projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Dębica. Z zakresu rzeczowego została do wykonania dostawa symulatora, jednak jest to uzależnione od uzyskania dofinansowania projektu.
8.	<i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
9.	<i>Tworzenie i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica	Nie dotyczy	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Na terenie Pustków-Osiedle oddano do użytku Park Linowy oraz Miasteczko Ruchu Drogowego oraz rozpoczęto budowę Skateparku.
10.	<i>Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych</i>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W podanym przedziale czasowym (lata 2020–2021) ze względu na panującą pandemię COVID-19 żadne z tego rodzaju działań nie były realizowane przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Wszystkie planowane zadania zostały odwołane.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica


Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 4 typów przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie: *Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych), Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji), Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych.* Zadania te mają szansę zostać wdrożone do końca kolejnego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z danymi w tabeli 6, nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2020–2021) wyniosły 628 079,25 zł. Według założeń programu szacunkowa wartość projektów uzupełniających miała docelowo wynieść 10 000 000 zł, w związku z tym wykonano 6% zakładanego planu finansowania. Głównym źródłem finansowania był budżet własny Gminy Dębica. Szczegółowy podział źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- budżet gminy: 499 279,25 zł;
- budżet Ministerstwa Edukacji i Nauki: 98 800,00 zł;
- budżet Fundacji Śnieżka: 30 000,00 zł.

Na wykresie 12 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Wykres 12 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających

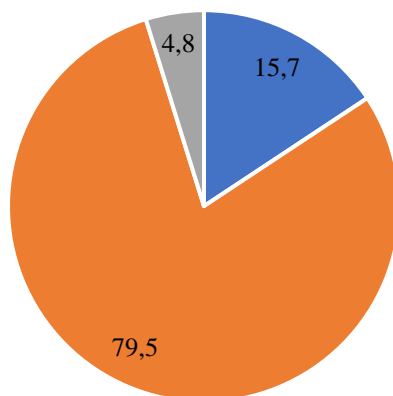

■ Ministerstwo Edukacji i Nauki ■ Budżet gminy ■ Fundacja Śnieżka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Podmiotami realizującymi działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest: Gmina Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, a także Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy. W ramach tych przedsięwzięć zrealizowano projekty, które przyczyniły się do eliminacji i ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

Podsumowanie

Przeprowadzony monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest drugim takim badaniem od uchwalenia dokumentu w 2017 r. W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja jest procesem długofalowym, pierwsze kilka lat prowadzonych prac to bardzo krótki okres, aby uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwalając dokument uznano, że rok 2024 będzie terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich oceny. Trudno więc oczekiwać w 2021 r. uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji. Z uwagi na to, że część projektów rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji lub została zaplanowana do realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu, efekty realizacji w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji będzie można uzyskać w późniejszym okresie. Faktem jest jednak niski stopień realizacji założeń GPR, podczas gdy pogłębiający się stan kryzysowy na obszarze (wskazują na to wskaźniki oddziaływania) powinien stanowić impuls do szybkiej i efektywnej interwencji. Aby osiągnąć zakładane cele rewitalizacji oraz zadowalający i trwały efekt, należy położyć większy nacisk na realizację rozpoczętego procesu rewitalizacji.

Projekty podstawowe, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w latach 2020–2021, mają dużą szansę być zrealizowane w zakładanym pierwotnie terminie. W okresie sprawozdawczym lat 2020–2021, żaden z potencjalnych interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił o modyfikację działań ujętych w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji programu w tym zakresie.

Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na niewielkie mierzalne efekty dotychczasowej interwencji rewitalizacyjnej na terenie Gminy Dębica. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację założeń wynikających z opracowanego GPR, szczególnie w zakresie projektów społecznych.

Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych. Jest to dobry punkt wyjścia do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Dębica nie jest tylko „pojedynczym epizodem” związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym procesem, prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i możliwych do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych. Należy mieć na uwadze brak

możliwości realizacji projektu *Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle* w zakładanym zakresie rzeczowym i lokalizacji. W związku ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami nie powinno się całkiem rezygnować z jego realizacji. Zaniechanie działań uniemożliwi osiągnięcie w pełni założonych celów. Należy podjąć działania w celu wskazania innego obiektu, który można zaadaptować na ten cel i w przypadku możliwości jego sfinansowania przystąpić do aktualizacji zakresu projektów GPR.

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu.....	8
Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12)	13
Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych.....	22
Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2021 r.....	24
Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR.....	27
Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR	31

Spis wykresów

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem	14
Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	15
Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	15
Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	16
Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	16
Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania.....	17
Wykres 7 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	18
Wykres 8 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	18
Wykres 9 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	19

Wykres 10 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	20
Wykres 11 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych	29
Wykres 12 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających ..	34
